Projektplan

QM-Brustzentrum NFKL

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	R
1	**Re-Init QZ-Brustzentrum**	**140 Tage**	**Di 06.11.07**	**Mo 19.05.08**		
2	Kickoff Strategieworkshop	0 Tage	Di 06.11.07	Di 06.11.07		
3	Pendenzen	22 Tage	Di 06.11.07	Mi 05.12.07	2	
4	Period. Sitzungen	140 Tage	Di 06.11.07	Mo 19.05.08	2	
5	Projektplanung u.a. Ressourcen, Aufgaben	19 Tage	Di 06.11.07	Fr 30.11.07	2	
6	Kooperation EVO	10 Tage	Mo 03.12.07	Fr 14.12.07	5	
7	Schreiben LGA und OnkoZert	1 Tag	Mo 03.12.07	Mo 03.12.07	5	
8	Pendenz Verordnungsblatt Dr. Winterhalder!!	34 Tage	Di 04.12.07	Fr 18.01.08	7	
9	Erhebungsbogen für Brustzentrum (DKG/DGS)	53 Tage	Mo 03.12.07	Mi 13.02.08	5	
10	Tumormachsorge extern/Brief verschicken	32 Tage	Mo 03.12.07	Di 15.01.08	5	
11	Tumormachsorge intern (Radio/Onkologie)	10 Tage	Mi 16.01.08	Di 29.01.08	10	
12	Externe Tumormachsorge Daten-Erfassung	20 Tage	Mi 16.01.08	Di 12.02.08	10	
13	Tumormachsorge Auswertung	9 Tage	Mi 13.02.08	Mo 25.02.08	12	
14	Gerätepass	50 Tage	Di 26.02.08	Mo 05.05.08		
15	OnkoZert (aktualisierte Verträge)	3 Tage	Mo 21.01.08	Mi 23.01.08	8	
16	Kooperationsvereinbarung	10 Tage	Do 24.01.08	Mi 06.02.08	15	
17	Zusammenarbeit Zuweiser (Bewertung) 2009??	25 Tage	Do 07.02.08	Mi 12.03.08	16	
18	Sentinelnodequalitätserfassung (Instrumente, Auswertu	36 Tage	Do 07.02.08	Do 27.03.08	16	
19	Gammasondenüberprüfung (NUK)	27 Tage	Do 07.02.08	Fr 14.03.08	16	
20	Inhaltverzeichnis Pflegehandbuch/Blaubuch	15 Tage	Do 13.03.08	Mi 02.04.08	17	
21	Ringversuchszertifikate Labor Qualab (Hplus)	12 Tage	Do 13.03.08	Fr 28.03.08	17	
22	Lenkung der Dokumente (für Q-Handbuch)	30 Tage	Mo 31.03.08	Fr 09.05.08	21	
23	**ODS easy**	**95 Tage**	**Mi 19.12.07**	**Di 29.04.08**		
24	Sitzung ODS easy	0 Tage	Mi 19.12.07	Mi 19.12.07		
25	Daten ODSeasy u.a. für nichtkarzinom OP	15 Tage	Mi 19.12.07	Di 08.01.08	24	
26	Patient- Doku Datenerhebung, Liste erstellen 06/06	19 Tage	Mi 19.12.07	Mo 14.01.08	24	
27	Dateneingabe komplementieren	26 Tage	Di 15.01.08	Di 19.02.08	26	
28	OP-Statistik Auswertung (Kaufmann/Smits)	15 Tage	Mi 20.02.08	Di 11.03.08	27	
29	Schulung, Datenaufbereitung	15 Tage	Mi 12.03.08	Di 01.04.08	28	

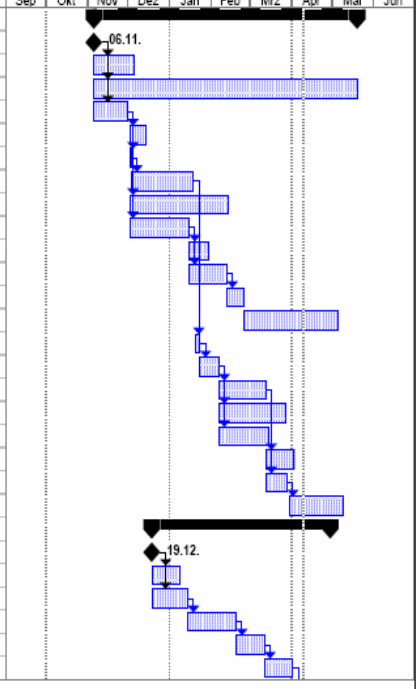

Projekt: Projektplan QM NFKL
Datum: Mi 09.04.08

Vorgang
Unterbrechung
In Arbeit
Meilenstein
Sammelvorgang
Projektsammelvorgang
Externe Vorgänge
Externer Meilenstein
Stichtag
